


UFFICIO
COORDINAMENTO
CANTIERI

CENTRO STORICO
AMATRICE



Supercantiere Amatrice

Reporto stato avanzamento lavori al 12/11/2024

Opere pubbliche

Planimetria generale centro storico di Amatrice


Opere pubbliche attive ●





Municipio



Chiesa San Giovanni

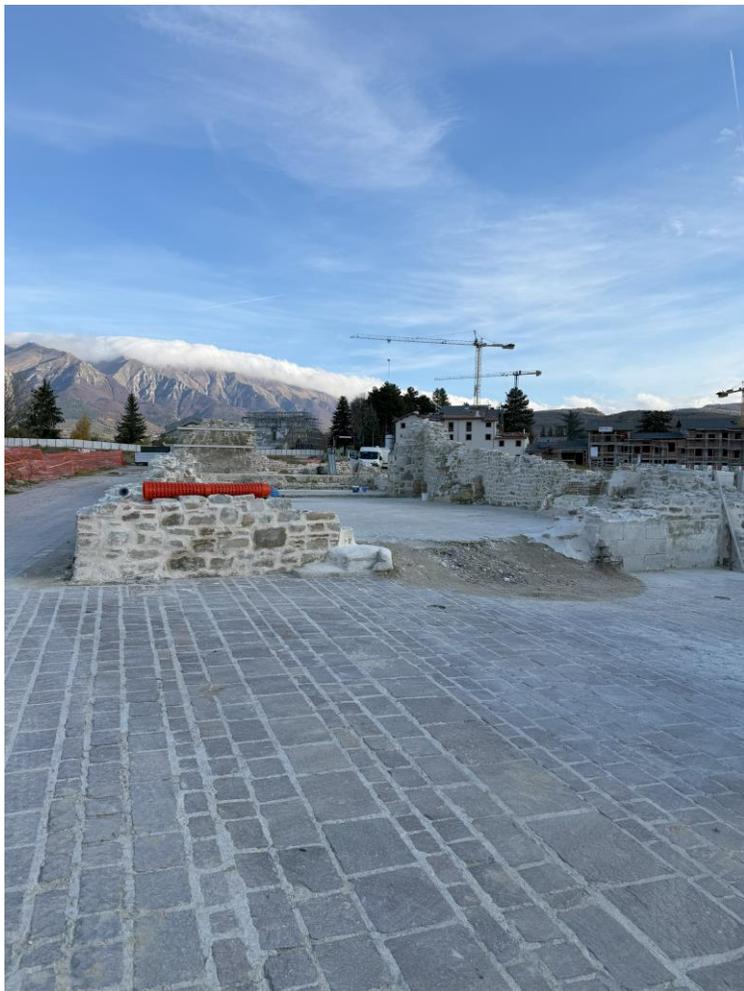

Ex convento San Francesco

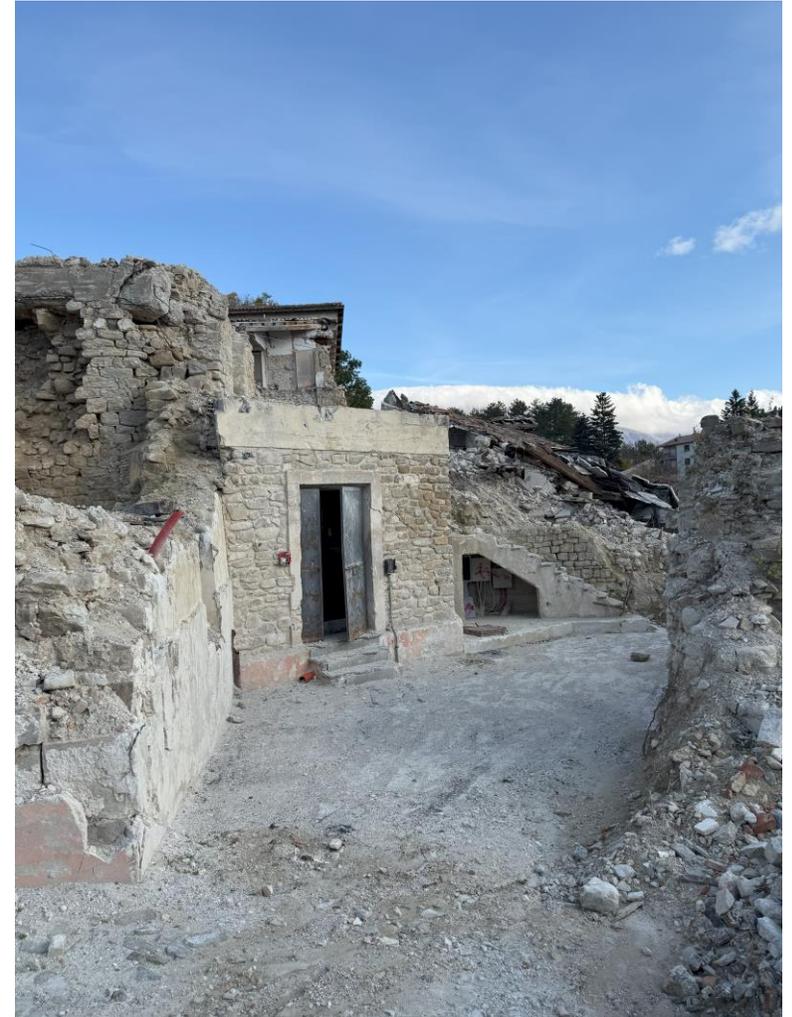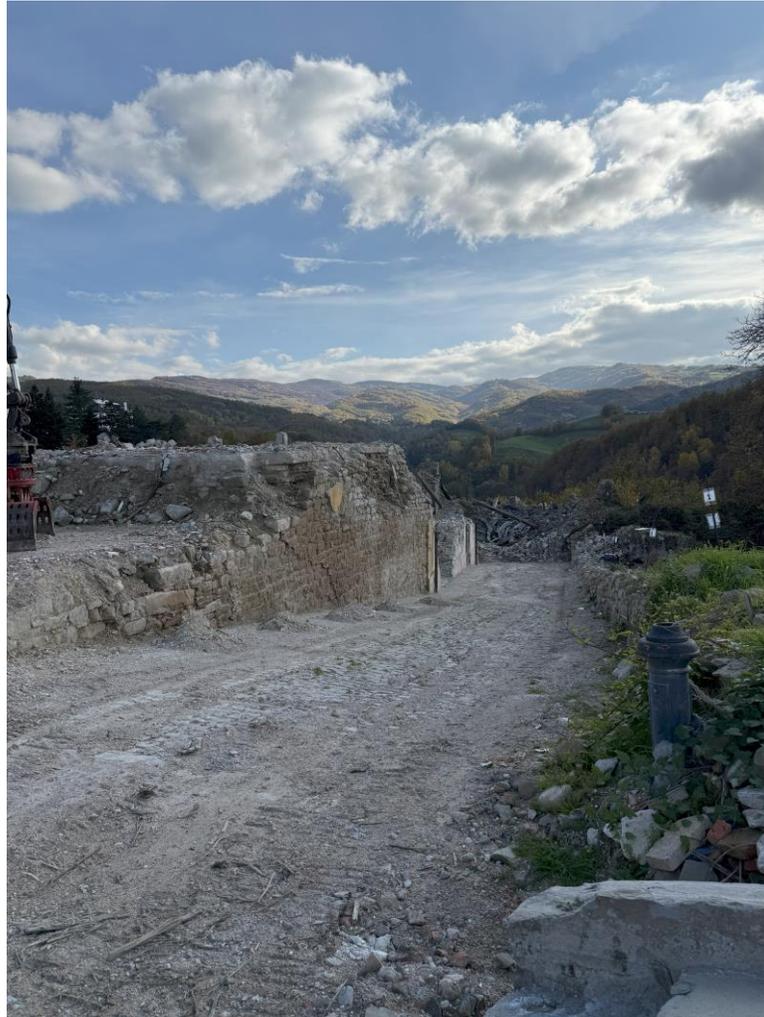

Chiesa Immacolata S.Maria Concezione



Chiesa Santa Maria Del Suffragio



Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO REGIONE LAZIO
RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

Codice Opere: 06_M_003_2011
Indirizzo: Via Piana, 27 - 01100 Fregene (VT) - Piana 2
C/O: 01100 Fregene (VT) - Piana 2
C/O: 01100 Fregene (VT) - Piana 2

STAZIONE APPALTANTE:
USR REGIONE LAZIO
Via Piana, Salaria, 27 - 01100 Fregene - www.usrregionelazio.it

DIRETTORE USR LAZIO: Dott. Stefano Formata
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Arch. Mariagrazia Gazzari
Ing. Simona Di Maggio

PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Progettista responsabile: Ing. Maurizio Scalfini
Progetto Architettonico: Arch. Chiara Pinnaresi
Progetto Strutturale: Ing. Roberto Pedicini
Progetto impiantistico: Ing. Sara Bernotta

Coordinatore della sicurezza (C.S.P.): Ing. Maurizio Scalfini
Direttore dei Lavori: Arch. Chiara Pinnaresi
Direttore Operativo: Ing. Roberto Pedicini
Direttore Operativo: Ing. Maurizio Scalfini
Supervisore di cantiere: Arch. Mariagrazia Gazzari
Coordinatore della sicurezza (C.S.E.): Ing. Maurizio Scalfini
Collaboratore:

ABACUS
Via Campi di Marte, 6/A - 00184 Perugia (PG)

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 2.256.759,93 di cui € 2.053.923,36 per lavori e € 202.836,57 per oneri sicurezza
CATEGORIA DI OPERE: D02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

RIBASSO D'ASTA: 19,45%
IMPORTO CONTRATTUALE: € 1.856.655,66 di cui € 1.653.819,09 per lavori e € 202.836,57 per oneri sicurezza

DATA CONSEGNA LAVORI: 07/10/2024
TEMPO UTILE: GG. 750
DATA ULTIMAZIONE LAVORI:

IMPRESA APPALTATRICE:
Direttore tecnico di cantiere: Geom. Di Marco Matteo
Capo cantiere: Geom. Fantuzzi Daniele

IMPRESA SUBAPPALTATRICI:


SMART TUNNEL



Corso Umberto I



Corso Umberto I

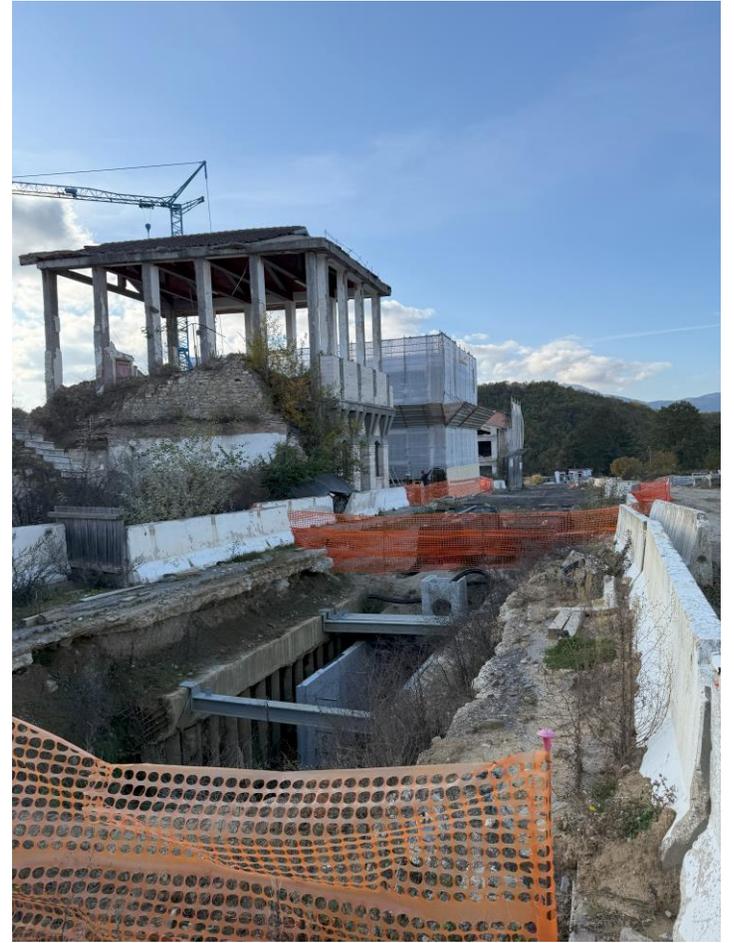


Corso Umberto I

SMART TUNNEL



Corso Umberto I

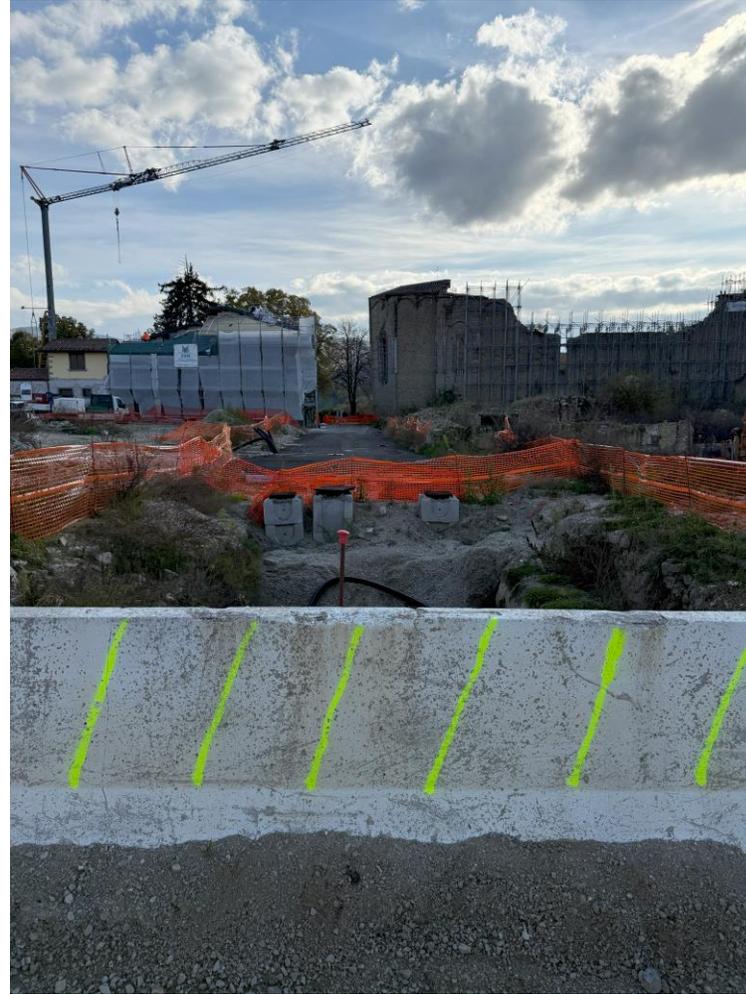


Via Roma

RETI ORDINARIE I Quadrante sud-est



Via Nicola Rosei

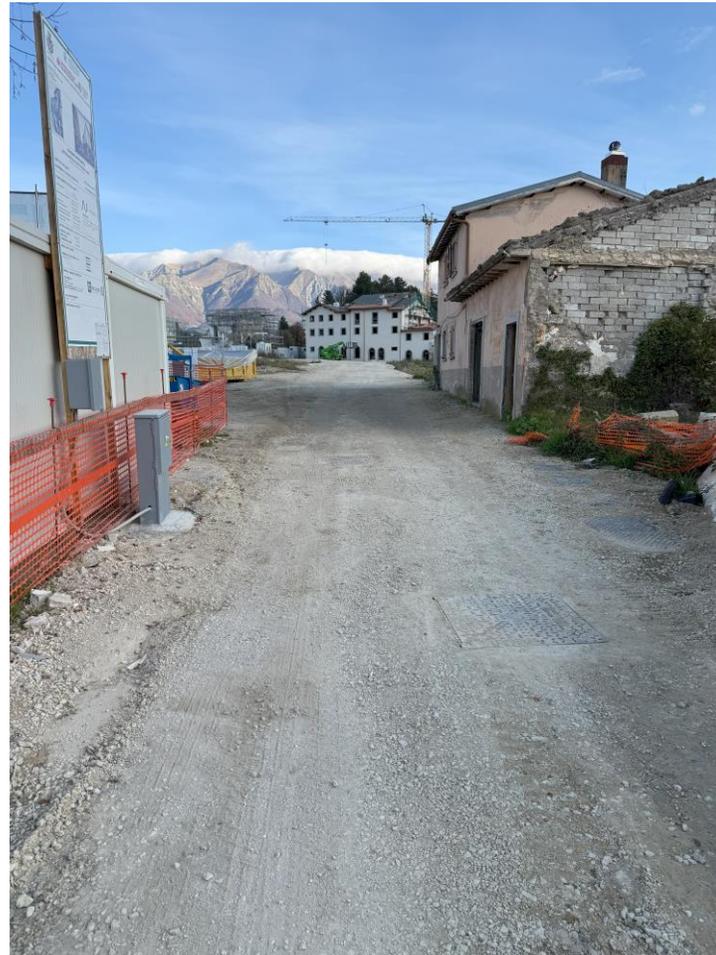

Via Nicola Rosei



Via Leopardi


RETI ORDINARIE | Quadrante sud-est



Via Dei Tiratori



Via Dei Tiratori

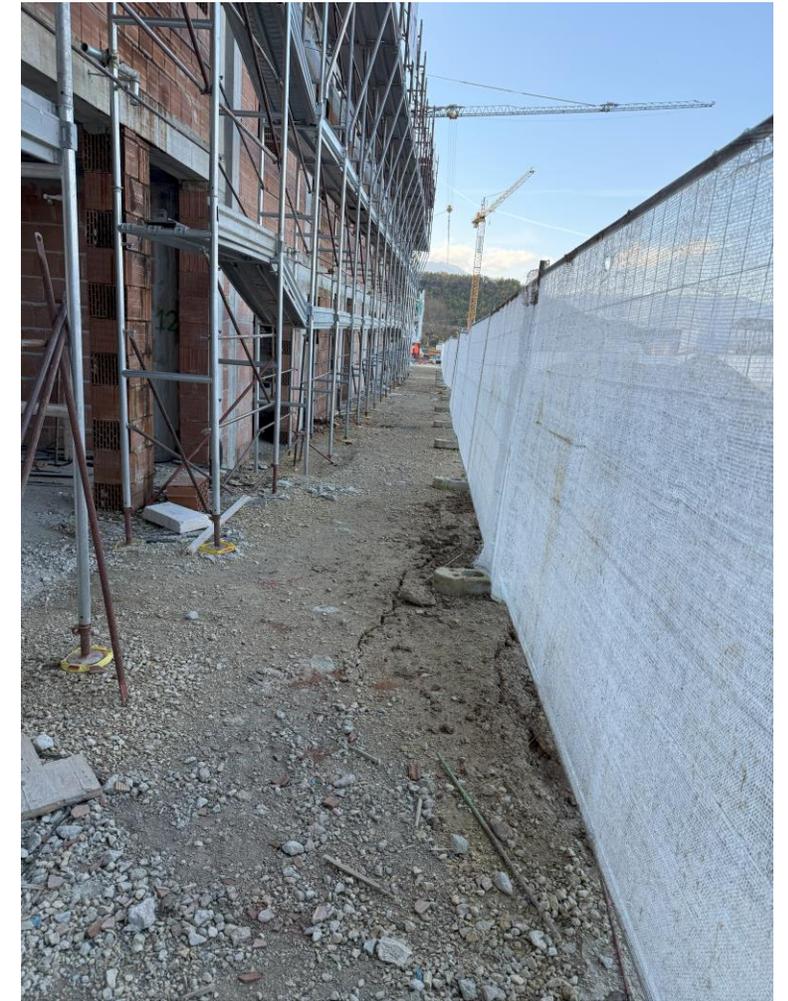


Via Garibaldi

RETI ORDINARIE II Quadrante sud-ovest



Via Teatro Vecchio

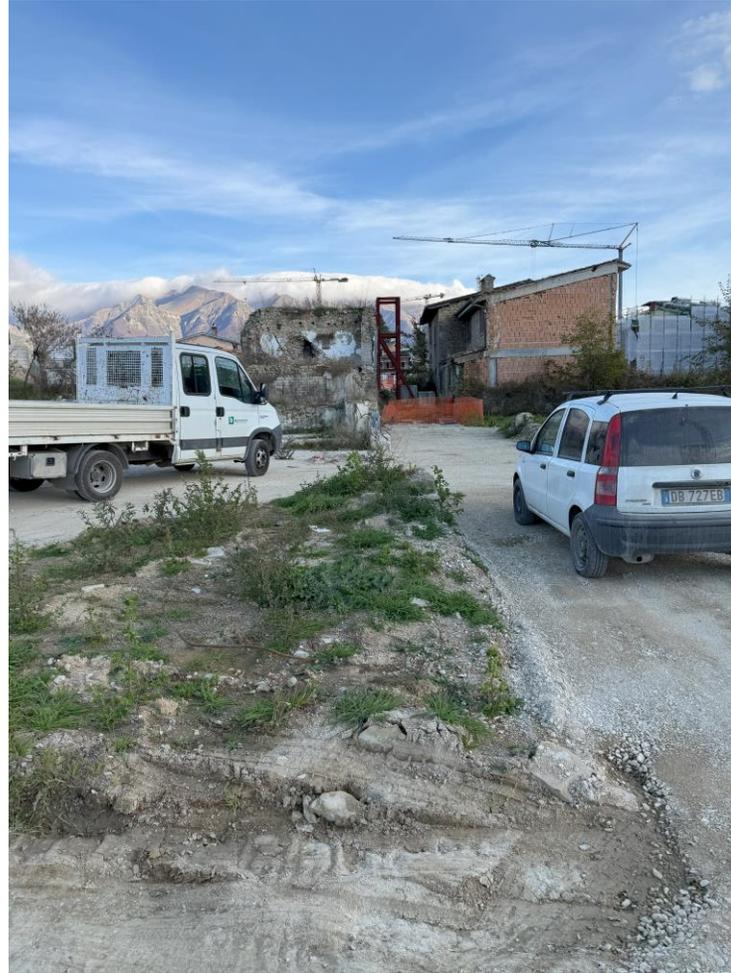

Via Conte Caponi



Via Antonio Nibbi


RETI ORDINARIE II Quadrante sud-ovest



Via Antonio Nibbi



Via Della Madonella

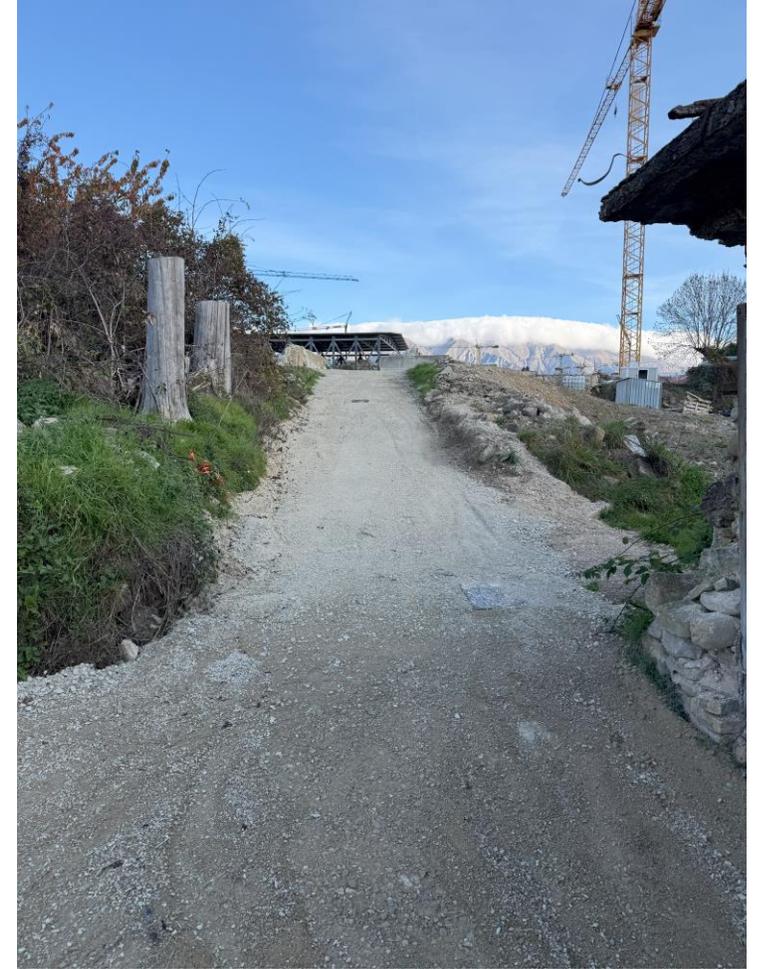

Via Della Madonella


RETI ORDINARIE II Quadrante sud-ovest



Via Della Madonella



Via Della Madonella

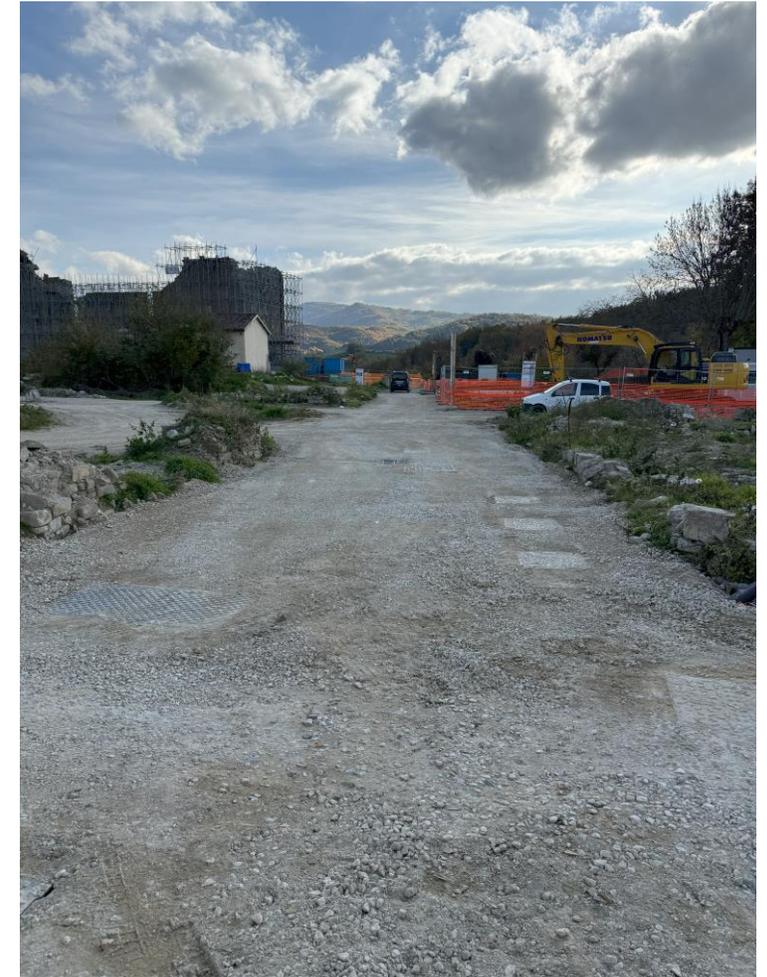

Via Madonna Della Porta
